

Instituto Tecnológico de Tlalpan

Ciudad de México, Tlalpan, 03/mayo/2018

No. DE OFICIO: ITTLALP/DIR /271/18

ASUNTO: INFORME DE ESTATUS DE RECURSOS PROEXOES 2016

**LIC. BLANCA G. MORENO PÉREZ**  
**DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN,**  
**PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA**  
**FÍSICA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
**P R E S E N T E**

Me refiero a su correo electrónico de fecha 30 de abril del año en curso, en virtud del cual solicita a esta Dirección, mediante oficio anexo M00.1/484.9/2018 de fecha 20 de abril del 2018, lo siguiente: "...Por instrucciones superiores, hago referencia al Seguimiento de la Auditoría Núm. 143-DS (Clave 800 Denominada al Desempeño), de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como el seguimiento de la Auditoría con número de revisión 09/2017, Clave 810 "Unidades Administrativas, sucursales, regionales o delegacionales y programas interinstitucionales" del Órgano Interno de Control (OIC) en la SEP, relacionados con la aplicación del recurso asignado en el marco del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Con respecto al Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior correspondiente al ejercicio fiscal 2016, hago de su conocimiento que dichos recursos no fueron otorgados a este Instituto Tecnológico de Tlalpan, y que las obras y/o adquisiciones no fueron llevadas a cabo por este plantel, siendo el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, el responsable de llevar a cabo el o los procedimientos de licitación de la obra " Construcción del Edificio para Talleres y Laboratorios y Obra Exterior del Instituto Tecnológico de Tlalpan". Así mismo le informo que el importe total de la obra, por un monto de \$ 37,099,326.67 (treinta y siete millones noventa y nueve mil trescientos veintiséis pesos con sesenta y siete centavos), fue transferido a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, como lo indica el oficio M00.1.2/461.1/2016 de fecha 16 de diciembre 2016, del cual anexa copia en el ANEXO I, que consta de una única foja.

En relación a los puntos solicitados en el oficio en mención hago de su conocimiento lo siguiente:

1. Acta de entrega recepción o finiquito correspondiente debidamente formalizados, para el caso de que las metas estén concluidas, especificando el Programa, la Meta, el Monto asignado y el Monto ejercido.

Respuesta : Este punto no aplica por estar en proceso la obra, en el ANEXO II en las fojas uno y dos se muestra la minuta de inicio de los servicios de la Gerencia de Proyectos para construcción de los edificios para talleres y laboratorios y obra exterior de los Institutos Tecnológicos de Gustavo A. madero y Tlalpan, de fecha 5 de diciembre de 2017.

2. De conformidad al instrumento jurídico formalizado en el ejercicio fiscal 2016, entre el TecNM y las autoridades estatales en la Cláusula cuarta inciso c), **informe físico financiero emitido por el instituto constructor o equivalente en el estado**, que avale la aplicación del recurso federal, con sellos y oficiales. Así mismo deberá detallar lo concerniente tanto a la asignación inicial como a los productos financieros generados a la fecha.

Instituto Tecnológico de Tlalpan

Respuesta: El informe físico-financiero se encuentra en el anexo III, viene anexo copia del oficio CAOS de fecha 17 de abril del 2018, firmado por Ismael Ocampo Cervantes Gerente de Proyectos de la Empresa Consultores y Asesores en Obras y Servicios, S.A. de C.V. En lo concerniente a la asignación inicial del recurso se puede consultar en el oficio de asignación de ANEXO I. Respecto a los productos financieros, en el ANEXO IV, se anexa oficio ITTLALP/DIR/151/18 de fecha 23 de febrero de 2018, donde se solicita al Instituto Local de Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, el estatus de los recursos asignados a esta Institución, adjuntando los informes financieros-físicos que conforme a la normatividad debe emitir, conteniendo el programa y año fiscal, el monto asignado, el monto ejercido, el monto por ejercer, informe de los productos financieros generados y aplicados, entre otros requerimientos.

3. En caso de modificación a la meta asignada, remitir documento que acredite su ajuste.

Este punto no aplica por no haber modificaciones a la meta.

4. Documentos o comunicados que demuestren la evidencia de las gestiones realizadas ante el órgano Constructor Estatal encaminadas al seguimiento del cumplimiento de metas específicas.

Respuesta: En el ANEXO IV, se anexa la solicitud al Instituto Local de Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México mediante oficio ITTLALP/DIR/151/18 de fecha 23 de febrero de 2018, el estatus de los recursos asignados a esta institución, adjuntando los informes financieros-físicos que conforme a la normatividad debe emitir, conteniendo el programa y año fiscal, el monto asignado, el monto ejercido, el monto por ejercer, informe de los productos financieros generados y aplicados, entre otros. En el ANEXO V, compuesto de seis fojas, en la foja uno se anexa copia de correo donde se da respuesta al Lic. Roberto Nevárez Valdés, referente a la solicitud de información con el objeto de valorar el proyecto de la Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios, solicitado como parte del PIFIT 2016; en la foja dos se muestra correo donde se da respuesta a la solicitud de evidencia de transparencia vía WEB, en las fojas tres y cuatro se anexa impresión de correo donde se informa del estado que guardan los recursos asignados mediante PROEXOES 2016, en la foja cinco se anexa impresión de correo electrónico de fecha 23 de agosto de 2017, donde se adjunta el oficio de asignación de los recursos PROEXOES 2016 para el proyecto de Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorio con número de oficio M00.1.2/461.1/2016, este oficio se puede consultar en el anexo I, la foja seis muestra copia de reporte de avance de obra de fecha 31 de diciembre de 2017.

5. Evidencia documental de la devolución ante la Tesorería de la Federación de los recursos no aplicados, contemplando tanto la asignación inicial como a los productos financieros generados, de ser el caso.

Respuesta: Este punto no aplica por estar en fase inicial la ejecución de la obra.

6. Evidencia documental sobre el uso de economías o remanentes.

Respuesta: Este punto no aplica por estar en proceso la ejecución de la obra.

Instituto Tecnológico de Tlalpan

7. Conforme al numeral XVI. Obligaciones de Transparencia de los Lineamientos de la Convocatoria y Cláusula cuarta, inciso f) del Instrumento Jurídico referido, enviar exclusivamente la impresión de pantalla y URL de la dirección de la página WEB del plantel a su cargo, mostrando como mínimo: monto asignado, monto ejercido, nombre del programa, descripción de la meta (obra y/o equipo) avance físico financiero con imágenes.

Respuesta: En el ANEXO VI, compuesta de siete fojas, de la foja uno a la tres se muestra las impresiones de pantalla de la página principal de transparencia del Instituto Tecnológico de Tlalpan, desde donde se accesa a las ligas de los documentos de transparencia. En la foja seis se encuentra el oficio de asignación de recursos, en la foja siete se muestra el documento del informe de avance de obra, en la foja cuatro se muestra fotografía del evento de la colocación de la primera piedra con la participación de la comunidad, en la foto cinco se aprecia el avance físico actual de la obra. La URL para acceder a esta información es la siguiente: [www.ittlalpan.edu.mx/TRANSPARENCIA.html](http://www.ittlalpan.edu.mx/TRANSPARENCIA.html)

8. Comprobante oficial del monto liquidado por el Instituto Constructor Estatal o equivalente, correspondiente al cuatro por ciento (4%) del costo de la obra, mismo que se encuentra incorporado y debidamente especificado en la Clausula novena del Instrumento Jurídico formalizado entre el TecNM y Estado. "

Respuesta: Este punto no aplica por no administrar el Instituto Tecnológico de Tlalpan los recursos financieros.

**ATENTAMENTE**

*Excelencia en Educación Tecnológica®*

*"NUESTRO ÉXITO, ES EL ÉXITO DE NUESTROS EGRESADOS"*

**DRA. ROCÍO CASTRO GONZÁLEZ  
DIRECTORA DE INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE TLALPAN**



# ANEXO I

## (Oficio de asignación)



Ciudad de México, 16 de diciembre 2016  
Oficio No. M00.1.2/461.1/2016

ARQ. DAVID ARTURO ZORRILLA COSÍO  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO LOCAL  
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA-CDMX  
PRESENTE

Me refiero al Instrumento Jurídico formalizado entre y el Instituto Local a su cargo y el Tecnológico Nacional de México, en el marco del Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2016 por un importe de \$148'274,520.00, al respecto me permito informar a usted, que conforme a la disponibilidad presupuestaria del citado programa, sólo fue posible beneficiar a los planteles que a continuación se señalan:

INSTITUTO TECNOLÓGICO	META	IMPORTE
Gustavo A. Madero	Construcción de la Unidad Académica Departamental tipo II y obras exteriores	\$37'099,326.68
Tlalpan	Construcción de la Unidad Multifuncional de Talleres, Laboratorios y obra exterior	\$37'099,326.67
	<b>TOTAL</b>	<b>\$74'198,653.35</b>

Es importante mencionar que el importe total de \$74'198,653.35 fue transferido a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, lo anterior para su conocimiento y efectos conducentes.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica*

LIC. BLANCA G. MORENO PÉREZ  
DIRECTORA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
TECNOLÓGICO NACIONAL  
DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN,  
PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA



INSTITUTO LOCAL  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA DEL D.F.

RECIBIDO  
DIRECCIÓN GENERAL

- C. p.- Dr. Héctor L. Martínez Castuera.- Secretaría de Administración-TecNM.  
M. C. Enrique Rodríguez Jacob.- Secretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional-TecNM.  
M. C. Gerardo Marchant Ortiz.- Director del Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero.  
Dra. Rocío Castro González.- Directora del Instituto Tecnológico de Tlalpan.

RNV/gsc.



# ANEXO II

## (Minuta de inicio)








MINUTA DE JUNTA No 03

FECHA: 05 de Diciembre de 2017

CONTRATO NUM. ILIFECDMX/047/2017

OBJETO: Inicio de los servicios de la Gerencia de Proyecto para la construcción de los edificios para talleres y laboratorios y obra exterior en los Institutos Tecnológicos de Gustavo A. Madero y Tlalpan.

## ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
M. en E. y Arq. Juan Antonio Almeida Sierra	Sub Gerente de Supervisión de la INFE	
Ing. Ismael Ocampo Cervantes	Gerente de Proyecto de Consultores y Asesores en Obras y Servicios, S.A. de C.V.	
Arq. Alfonso Bravo Rodríguez	Proyectista Arquitectónico de Consultores y Asesores en Obras y Servicios, S.A. de C.V.	
Dra. Roció Castro Gorzález	Directora del Instituto Tecnológico Tlalpan	
M.C. Gerardo Merchant Ortiz	Director del Instituto Tecnológico Gustavo A. Madero	

## MINUTA DE JUNTA No 03

FECHA: 05 de Diciembre de 2017

Nº	ASUNTO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	La Gerencia de Proyecto presenta a la Residencia de Obra del ILIFECDMX, los proyectos arquitectónicos relativos a los Institutos Tecnológicos de Tlalpan y Gustavo A. Madero, con base a las adecuaciones marcadas por esta última en reuniones anteriores.	CAOS	PRESENTA
2	En particular el Director del IT Gustavo A. Madero, solicita a la Residencia de Obra del ILIFECDMX las siguientes adecuaciones al proyecto presentado:	Director IT GAM	
3	<p>*Los muros de planta baja deberían ser considerados de tabique y no de cancelería por así convenir a las aplicaciones de laboratorio que pretender dar a esas zonas.</p> <p>*Se solicita considerar un área igual a la del IT Tlalpan destinada a Site.</p> <p>*Con relación a la jefatura que se ubica en planta baja eje 3-c se solicita su reacomodo de tal forma que la sala de juntas se encuentre primero que la jefatura antes mencionada.</p>	Directr IT GAM	SOLICITA
4	En particular el Director del IT Tlalpan, solicita a la Residencia de Obra del ILIFECDMX las siguientes adecuaciones al proyecto presentado:	Directr IT TLALPAN	
5	*La adecuación mas radical en este caso es cambiar de ubicación al extremo inferior izquierdo la zona de maestros para confinar zona de maestros en un ala de edificio y en la otra la zona de talleres y aulas.	Directr IT TLALPAN	SOLICITA
6	Con base a lo descrito en lo anterior, la Residencia de Obra del ILIFECDMX instruye a la Gerencia de Proyectos para tomar en consideración estas peticiones y realizar las adecuaciones correspondientes.	ILIFECDMX	INSTRUYE
7	La Gerencia de Proyectos atiende las instrucciones de la Residencia de Obra del ILIFECDMX pero informa que por su puesto estas adecuaciones generará un retraso en la entrega de los estudios y proyectos contratados.	CAOS	INFORMA

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la junta a las 12:00 horas del día de su inicio llevada a cabo en las instalaciones de la Residencia de Obra del ILIFECDMX.



# ANEXO III

## (Informe de avance de obra)



CA

OS

**Consultores y Asesores en Obras y Servicios, S.A. de C.V.**

OFICIO CAOS

CDMX. a 17 de abril de 2018


**Instituto Tecnológico Tlalpan**  
Rocío Castro González  
Directora Instituto Tecnológico Tlalpan

Me refiero al contrato ILIFECDMX/065/2017, relativo a los trabajos de "Construcción de Unidad Multifuncional de Talleres, Laboratorios y Obras Exteriores del Instituto Tecnológico Tlalpan", ubicado en Cerrada Santa Cruz No. 4, predio Tetenco, Col. Centro, Pueblo de San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Ciudad de México.

Con respecto a su solicitud de avance de obra, se le hace entrega del avance general de la construcción del Edificio de Talleres, la Gerencia de Obra y DRO.

Por lo anterior le agradezco su atención y le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

  
Ing. Ismael Ocampo Cervantes  
Gerente de Proyecto

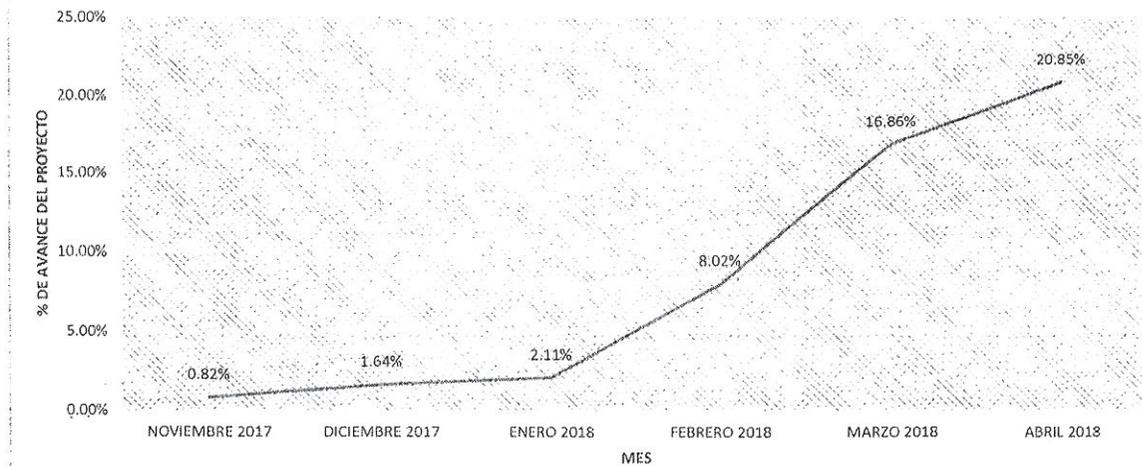


**AVANCE GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS, Y OBRA EXTERIOR  
 AL 15 DE ABRIL DE 2018**

PRESUPUESTO FEDERAL AUTORIZADO \$ 36'594,542.92 CON IVA

MES	ORIGEN	MONTO EJERCIDO	MONTO ACUMULADO	PORCENTAJE	PORCENTAJE ACUMULADO
NOVIEMBRE 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 259,550.75	\$ 259,550.75	0.82%	0.82%
DICIEMBRE 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 257,657.88	\$ 517,208.63	0.82%	1.64%
ENERO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 147,188.64	\$ 664,397.27	0.47%	2.11%
	OBRA	\$ -	\$ 664,397.27	0.00%	
	DRO	\$ -	\$ 664,397.27	0.00%	
FEBRERO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 201,883.48	\$ 866,280.75	0.64%	8.02%
	OBRA	\$ 1,662,698.05	\$ 2,528,978.80	5.27%	
	DRO	\$ -	\$ 2,528,978.80	0.00%	
MARZO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 181,374.86	\$ 2,710,353.66	0.57%	16.86%
	OBRA	\$ 2,609,550.47	\$ 5,319,904.13	8.27%	
	DRO	\$ -	\$ 5,319,904.13	0.00%	
ABRIL 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ -	\$ 5,319,904.13	0.00%	20.85%
	OBRA	\$ 1,256,148.36	\$ 6,576,052.49	3.98%	
	DRO	\$ -	\$ 6,576,052.49	0.00%	

**PRESUPUESTO EJECUTADO**





# ANEXO IV

(Solicitud de avance físico-financiero)



INSTITUTO  
TECNOLÓGICO  
DE TLALPAN

Av. Cerrada Santa Cruz N° 4,

San Miguel Topilejo, Delegación Tlalpan, Ciudad de México

Tel. (55) 55-13-51-51

[www.ittlalpan.edu.mx](http://www.ittlalpan.edu.mx)



ACUSE

Lic. David Arturo Zórrilla Cosío  
Director General  
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa  
de la Ciudad de México

Ciudad de México, 23/Febrero/2018

No. DE OFICIO: ITTLALP/DIR/151/18



ASUNTO: SUBGERENTE LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL D.F.  
RECIBIDO

16 APR 2018  
Handwritten signature and initials

SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN  
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA

Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo y solicitarle, por instrucciones superiores y a petición de los órganos fiscalizadores, que remita a ésta Dirección el estatus del total de los recursos asignados a ésta institución a mi cargo, adjuntando los Informes Financieros Físicos que conforme a la normatividad emite como Instituto Constructor Estatal y que contengan la siguiente información:

- programa y año fiscal al que pertenece
- Monto Asignado
- Monto ejercido
- Monto por ejercer
- Contrato y/o pedido por concepto del proyecto o meta autorizada
- Avance físico del proyecto o meta autorizada
- Avance financiero del proyecto o meta autorizada
- Ultimo estado de cuenta productiva, que es exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos
- Acta de entrega-recepción de la obra concluida o bienes y/o, en su caso, finiquito de la obra
- Autorización del TecNM por la aplicación de los recursos remanentes.
- Informe de los productos financieros generados y aplicados por ejercicio

Se precisa que deberá informar del total de la aplicación de los recursos que incluya los productos financieros generados al presente.

Agradezco las atenciones a la presente, y quedo a su disposición para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

"Nuestro éxito es el éxito de nuestros egresados"

Dra. Rocio Castro Gonzalez  
Directora



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE TLALPAN  
DIRECCIÓN



INSTITUTO LOCAL  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA DEL D.F.



RECIBIDO  
DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p. Arq. Juan Antonio Almeida Sierra - Subgerente de Supervisión de la Infraestructura Física Educativa.  
Lic. Blanca Gloria Moreno Pérez - Directora de Programación, Presupuestación e Infraestructura Física  
- Tecnológico Nacional de México  
Archivo.

RCG/NMNI/NNM





# ANEXO V

(Evidencia de seguimiento al proyecto)



INSTITUTO  
TECNOLÓGICO  
DE TLALPAN

Av. Cerrada Santa Cruz N° 4,

San Miguel Topilejo, Delegación Tlalpan, Ciudad de México

Tel. (55) 55-13-51-51

[www.ittlalpan.edu.mx](http://www.ittlalpan.edu.mx)



----- Mensaje original -----  
Asunto: Re: Solicitud información proyectos PFIIT 2016  
Enviado: 02/09/2016 11:45  
De: Instituto Tecnológico de Tlalpan <tectlalpan@hotmail.com>  
Para: "Dra. Rocio Castro González" <dir\_tlalpan@tecnm.mx>; ROBERTO NEVÁREZ VALDEZ <d\_programacion03@tecnm.mx>

Envío toda la información y documentación solicitada.  
Quedo a sus ordenes para cualquier duda y/o aclaración

Emmanuel Olmos Barba  
Subdirector de Planeación y Vinculación

From: ROBERTO NEVÁREZ VALDEZ  
Sent: Thursday, September 1, 2016 4:19:48 PM  
To: Dra. Rocio Castro González  
Cc: BLANCA MORENO PÉREZ; ENRIQUE RODRIGUEZ JACOB  
Subject: Solicitud información proyectos PFIIT 2016

Dra. Rocio Castro González  
Director del IT de Tlalpan

En los proyectos de obra presentados en su PFIIT 2016, se encuentra Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios. Con objeto de valorar en su caso la realización de dicha obra, por instrucciones superiores le solicito nos sea remitida la información que a continuación se indica:

-Plano de conjunto de ese plantel a su cargo, señalando con precisión en qué lugar tiene planteada la construcción de la obra citada.

-La documentación que acredite la propiedad o posesión del predio correspondiente.

En caso de tener lo siguiente;

-Estudio de mecánica de suelos y

-Estudio topográfico.

Agradezco su apoyo para que dicha información en todos los puntos citados, sea proporcionada de forma inmediata por correo electrónico a un servidor. Quedo a sus órdenes para cualquier precisión al respecto.

Agradezco se confirme la recepción del presente.

Le envío cordiales saludos.

Atentamente

ROBERTO NEVÁREZ VALDEZ  
Jefe de Área de Infraestructura Física y Mantenimiento

Tel. 36 01 10 00. Ext. 64953

[d\\_programacion03@tecnm.mx](mailto:d_programacion03@tecnm.mx)

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado |

## Publicación en pagina WEB de recursos asignados.

NN NESTOR NAVARRETE Responder a todos |  
mar 07/11/2017, 12:33 p.m.  
BLANCA MORENO PÉREZ; ROBERTO NEVÁREZ VALDEZ; Dra. Rocío Ca

Elementos enviados

WEP-ITTlalpan.docx  
407 KB

Mostrar todos 1 archivos adjuntos (407 KB) Descargar Guardar en OneDrive - Tecnológico Nacional de México

Aquí la evidencia de la publicación en pagina WEB de recursos asignados para obra al Instituto Tecnológico de Tlalpan, la cual puede ser accesada e través de la URL <http://www.ittlalpan.edu.mx/TRANSPARENCIA.html>. Slds

NESTOR MANUEL NAVARRETE INFANTE  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado |

## RE: Estatus Proexoees 2016 IT Tlalpan

**BP** BLANCA MORENO PÉREZ  
mar 11/07/2017, 01:05 p.m.  
EMMANUEL OLMOS BARBA; BLANCA MORENO PÉREZ

Responder a todos |

Bandeja de entrada

Estimado Maestro Emmanuel Olmos:

Agradecemos la información recibida, solamente requeriríamos el archivo que se señala como anexo de su correo y saber si recibieron del ILIFE el cronograma para la realización de la obra correspondiente.

Reciba un cordial saludo  
Blanca Moreno

**De:** EMMANUEL OLMOS BARBA

**Enviado el:** martes, 11 de julio de 2017 12:13 a. m.

**Para:** BLANCA MORENO PÉREZ <d\_programacion@tecnm.mx>; ROBERTO NEVÁREZ VALDEZ <d\_programacion03@tecnm.mx>; Dra. Rocío Castro González <dir\_tlalpan@tecnm.mx>

**Asunto:** Estatus Proexoees 2016 IT Tlalpan

Lic. Blanca Gloria Moreno Perez  
Directora de Programación Presupuestal e Infraestructura Física

Agradeciendo la excelente gestión del Tecnológico Nacional de México, dirigido por nuestro Director General Mtro. Manuel Quintero Quintero y su equipo de trabajo en coordinación con la administración directiva del IT Tlalpan encabezada por la Dra. Rocio Castro González, Directora, y con el objeto de dar cumplimiento a la Auditoría 143-DS de la Auditoría Superior de la Federación, de la manera más atenta nos permitimos informar a la Dirección de Programación, Presupuestación e Infraestructura del TecNM, que a la fecha actual no se cuenta con el informe físico – financiero del Instituto Constructor Estatal correspondiente, así mismo es nuestro deber informar el estatus de los proyectos autorizados en dicho programa asignados al IT Tlalpan, es importante señalar que aún no han sido aplicados los recursos autorizados, por lo que se anexa un breve informe y se adjuntan los documentos que justifican las acciones realizadas por el IT Tlalpan ante las instancias estatales correspondientes.

INFORME DEL ESTATUS DEL PROYECTO

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado |

Tecnológico de Tlalpan le fue asignada la cantidad de \$32,093,247.00 vía PIFIT 2016. El monto se destinara a la construcción de una Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios. (Se anexa listado de programas de inversión)

2.- Derivado de dicha asignación, se nos convocó a participar a 4 reuniones de trabajo en las oficinas del INIFED, en donde se establecieron ciertos parámetros en el proceso de definición de infraestructura.

3.- Se acuerda en una de esas reuniones, que el plantel debe proporcionar tanto a INIFED como al área de Área de Infraestructura Física y Mantenimiento de DG, la documentación referente a la propiedad del terreno, estudios de mecánica de suelos, proyecciones de crecimiento, entre otros. Dicha documentación se entregó a inicios del mes de septiembre, 2016. (Se anexa evidencia de correo y la documentación descrita).

4.- Dan inicio reuniones de trabajo con ILIFECDMX con la finalidad de proyectar el plan maestro que incluye la Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios. (Se anexa propuesta de plan maestro).

5.- A solicitud de la Secretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de DG, se determina el espacio de construcción de la Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios y se solicita apoyo a las oficinas de Ordenamiento Territorial de la Delegación Tlalpan, para llevar a cabo un estudio topográfico a fin de delimitar los deslindes.

6.- Se entrega a la Secretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de DG la propuesta detallada de espacios de las plantas de la UMTL, de acuerdo a las necesidades manifestadas por las áreas académicas; la entrega se hace en conjunto con el listado de equipamiento y presupuestos del programa "escuelas al 100" con el que fuimos beneficiados. (Se anexa documento de adecuación de áreas y descripción de las mismas).

Agradeciendo de antemano la atención al correo, estaremos atentos a sus indicaciones.

Atentamente

MGTI Laura Angélica May Salazar  
Subdirectora de Planeación y Vinculación  
IT Tlalpan

---

**RV: Oficio No. M00.1.2/461.1/2016 relacionado con el ILIFE\_CDMX y el IT de Tlalpan.**

1 mensaje

---

**Dra. Rocío Castro González** <dir\_tlalpan@tecnm.mx>  
Para: "Mtro. José Villegas Vázquez" <tlacotencov@gmail.com>

3 de mayo de 2018, 19:30

**ATENTAMENTE***"Nuestro éxito, es el éxito de nuestros egresados"***Dra. Rocío Castro González****DIRECTORA**

Instituto Tecnológico de Tlalpan

Av. Cerrada Santa Cruz No. 4

San Miguel Topilejo, Delegación Tlalpan, México. D.F

Tel. (55) 55135151 dir\_tlalpan@tecnm.mx

---

**De:** GUILLERMINA SANSON CASTILLO**Enviado:** miércoles, 23 de agosto de 2017 15:20**Para:** Dra. Rocío Castro González**Cc:** ROBERTO NEVÁREZ VALDEZ**Asunto:** Oficio No. M00.1.2/461.1/2016 relacionado con el ILIFE\_CDMX y el IT de Tlalpan.**DRA. ROCÍO CASTRO GONZÁLEZ****DIRECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO****DE TLALPAN**

Estimada Doctora, por instrucciones superiores, remito a usted el Oficio antes mencionado, está relacionado al instrumento jurídico formalizado entre el ILIFE-CDMX y el TecNM, en asunto conexo con el Instituto Tecnológico a su cargo, en días próximos lo recibirá a través de mensajería, mientras tanto, atentamente solicitamos acusar de recibido. gracias saludos cordiales. 5/6



Ciudad de México, 16 de diciembre 2016  
Oficio No. MOO.1.2/461.1/2016

ARQ. DAVID ARTURO ZORRILLA COSÍO  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO LOCAL  
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA-CDMX  
PRESENTE

Me refiero al Instrumento Jurídico formalizado entre y el Instituto Local a su cargo y el Tecnológico Nacional de México, en el marco del Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2016 por un importe de \$148'274,520.00, al respecto me permito informar a usted, que conforme a la disponibilidad presupuestaria del citado programa, sólo fue posible beneficiar a los planteles que a continuación se señalan:

INSTITUTO TECNOLÓGICO	META	IMPORTE
Gustavo A. Madero	Construcción de la Unidad Académica Departamental tipo II y obras exteriores	\$37'099,326.68
Tlalpan	Construcción de la Unidad Multifuncional de Talleres, Laboratorios y obra exterior	\$37'099,326.67
TOTAL		\$74'198,653.35

Es importante mencionar que el importe total de \$74'198,653.35 fue transferido a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, lo anterior para su conocimiento y efectos conducentes.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
*Excelencia en Educación Tecnológica*



INSTITUTO LOCAL  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA DEL D.F.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
TECNOLÓGICO NACIONAL  
DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN,  
PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

RECIBIDO  
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. BLANCA G. MORENO PÉREZ  
DIRECTORA

- C. p.- Dr. Héctor L. Martínez Castuera.- Secretaría de Administración-TecNM.
- M. C. Enrique Rodríguez Jacob.- Secretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional-TecNM.
- M. C. Gerardo Marchant Ortiz.- Director del Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero.
- Dra. Rocío Castro González - Directora del Instituto Tecnológico de Tlalpan.

RNV/gsc.

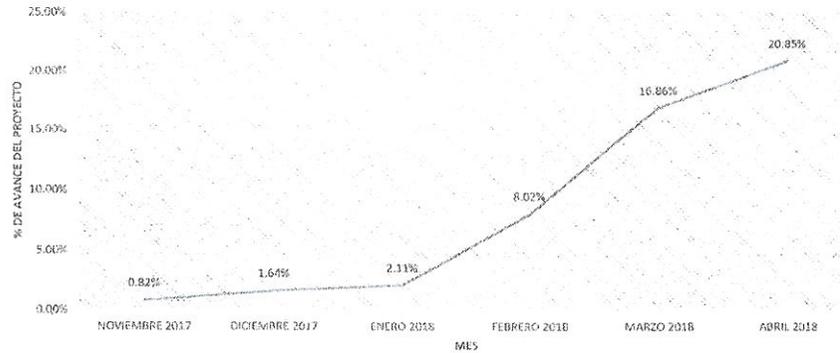


AVANCE GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS, Y OBRA EXTERIOR  
 AL 15 DE ABRIL DE 2018

PRESUPUESTO FEDERAL AUTORIZADO \$ 36'594,542.92 CON IVA

MES	ORIGEN	MONTO EJERCIDO	MONTO ACUMULADO	PORCENTAJE	PORCENTAJE ACUMULADO
NOVIEMBRE 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 259,550.75	\$ 259,550.75	0.82%	0.82%
DICIEMBRE 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 257,657.88	\$ 517,208.63	0.82%	1.64%
ENERO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 147,188.64	\$ 664,397.27	0.47%	2.11%
	OBRA	\$ -	\$ 664,397.27	0.00%	
	DRO	\$ -	\$ 664,397.27	0.00%	
FEBRERO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 201,883.48	\$ 866,280.75	0.64%	8.02%
	OBRA	\$ 1,662,698.05	\$ 2,528,978.80	5.27%	
	DRO	\$ -	\$ 2,528,978.80	0.00%	
MARZO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 181,374.86	\$ 2,710,353.66	0.57%	16.86%
	OBRA	\$ 2,609,550.47	\$ 5,319,904.13	8.27%	
	DRO	\$ -	\$ 5,319,904.13	0.00%	
ABRIL 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ -	\$ 5,319,904.13	0.00%	20.85%
	OBRA	\$ 1,256,148.36	\$ 6,576,052.49	3.98%	
	DRO	\$ -	\$ 6,576,052.49	0.00%	

PRESUPUESTO EJECUTADO





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

## SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INOVACIÓN

Instituto Local de la Infraestructura Física  
Educativa, CDMX

### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL INMUEBLE “UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES, LABORATORIOS Y OBRA EXTERIOR” DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO TLALPAN, UBICADO EN CERRADA SANTA CRUZ N°4, PREDIO TETENCO, COLONIA CENTRO, PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO, ALCALDIA DE TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO.

Siendo las 11:00 horas del día 01 de marzo de 2019, reunidos los Servidores Públicos que se enlistan más adelante, en las instalaciones del nuevo edificio del Talleres y Laboratorios del Instituto Tecnológico Tlalpan ubicado en cerrada Santa Cruz n°4, predio Tetenco, colonia centro, pueblo San Miguel Topilejo, alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México. El Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, entrega al Instituto Tecnológico de Tlalpan el inmueble correspondiente.

Asisten a este acto los Servidores Públicos que se enlistan a continuación:

Por el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México que entregan:

Nombre	Cargo	Firma
Dr. Carlos Alfonso Lara Esparza	Director del ILIFECDMX	

Por el Tecnológico Nacional de México en su calidad de testigo de honor.

Nombre	Cargo	Firma
Lic. Roberto Nevárez Valdez	Director del Área de Infraestructura Física y Mantenimiento del TECNM	

Por el Instituto Tecnológico Tlalpan del Tecnológico Nacional de México de la Secretaría de Educación Pública que reciben:

Nombre	Cargo	Firma
Dra. Rocío Castro González	Directora del Instituto Tecnológico Tlalpan	
Lic. Norma Delgado Díaz	Sub directora de planeación del Instituto Tecnológico Tlalpan	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

## SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INOVACIÓN

Instituto Local de la Infraestructura Física  
Educativa, CDMX

### I.- Antecedentes

Mediante el Convenio de Coordinación para el ejercicio del Fondo de Aportaciones Múltiples, la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, actualmente el Tecnológico Nacional de México (TecNM) encargó al Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, la construcción del inmueble "Unidad Multifuncional de Talleres, Laboratorios y Obra Exterior" del Instituto Tecnológico Tlalpan, objeto de este acto.

Atendiendo el Convenio de Coordinación mencionado, los trabajos para la construcción del inmueble antes citado, en el Instituto Tecnológico Tlalpan, se iniciaron durante el mes de febrero de 2018 bajo el amparo del contrato ILIFEDF/065/2017 y convenio de diferimiento número 2, concluyendo los trabajos relativos a este contrato el pasado 28 de febrero 2019, en tiempo y forma, con base a los convenios celebrados para este contrato.

### II.- Descripción de los trabajos que se entregan.

En este acto se entrega el inmueble denominado: "Unidad Multifuncional de Talleres, Laboratorios y Obra Exterior" del Instituto Tecnológico Tlalpan, mismo que describe por partidas a continuación; así mismo se entregan documentos que acompañan a este documento:

#### II.1.- Instalaciones

- a) **Preliminares:** Consistente en trabajos de trazo y nivelación de terreno, así como el letrero de obra y asegurar perfectamente la zona de trabajos mediante tapial de madera; se realizan las excavaciones y acarreo de materiales, cuidando en todo momento los lineamientos que indica la SEDEMA.
- b) **Cimentación:** Particularmente consistentes en la construcción de la cimentación del edificio, a base de pilas de concreto armado. Se realizaron las perforaciones, habilitado y armado de acero, así como el colado de las mismas; lo anterior por su puesto resolviendo todas las salvedades que este proceso constructivo generó durante su desarrollo.
- c) **Estructura:** De acero, la cual fue habilitada en taller, donde se verificó en todo momento que cumpliera con las características, dimensiones y especificaciones marcadas en el proyecto, así como en las normas correspondientes. Se montó en obra con grúa, y el personal que realizó la soldadura estuvo supervisado para que el mismo fuera calificado en esta área de trabajo. Se colocó losacero, conectores tipo Nelson, malla electrosoldada para recibir el concreto premezclado y forma de esta manera las losas de entre piso y azotea. Fue aplicada a toda la estructura que conforma a este edificio, así como a la losacero, pintura intumescente (retardante de fuego), a la cual se aplicaron de manera rigurosa las pruebas correspondientes, siendo por su puesto, favorables.



- d) **Escaleras:** De estructura metálica, forjándose así los escalones, descansos y barandales marcados en proyecto, con las dimensiones y características correspondientes; se le aplico de igual forma pintura anti-fuegos a esta estructura metálica.
- e) **Albañilería y Acabados:** Trabajos correspondientes a la construcción de pisos de concreto hidráulico, dallas de desplante, intermedias y de remate, castillos para la confinación de muros, entortados en azoteas, aplicación de impermeabilizante en azotea; todos ellos ejecutados bajo la supervisión correcta apegados a los proyectos y normas de construcción vigente.
- f) **Cancelería en Fachadas:** Fundamentalmente relativos al suministro y colocación de cancelería en fachadas principal (norte) y posterior (sur), así como cancelas y puertas de emergencia en fachadas oriente y poniente; también se incluyeron cancelas en site, cuartos de préstamos, y oficinas de jefatura y sala de junta. Sin olvidar el domo en azotea a base de louvers de aluminio y cristal templado.
- g) **Muros de Tabique:** Construidos en el interior del edificio como muros divisorios, aplanados con mortero cemento arena, hasta obtener un acabado fino, y terminados con la aplicación de pintura vinílica en cada uno de ellos.
- h) **Instalaciones Eléctricas con Media y Baja Tensión:** de media y baja tensión, las cuales fueron ejecutadas desde la subestación existente en el complejo, pasando por el transformador tipo pedestal, instalado para dar servicio independiente a este edificio. Tableros general y de zonas, luminarias, apagadores, contactos, y salidas para contactos trifásicos, fueron instalados apegados a la norma NOM-001-SEDE-2012 bajo la supervisión de la Gerencia de Proyectos, corresponsable de instalaciones y unidad verificadora eléctrica.
- i) **Hidráulicas y Sanitarias (incluye bajadas pluviales y contra incendio):** Las que se contemplan en proyecto, tales como wc's, lavabos, mingitorios, tarjas de aseo, salidas para bebederos y bajadas de aguas pluviales, son las instalaciones hidráulicas y sanitarias ejecutadas en el interior del edificio; en el exterior se construyeron redes de agua potable, contra incendio, albañales sanitarios y los registros necesarios para cada uno de ellos.
- j) **Voz y Datos:** Es inevitable pensar en un edificio destinado a educación superior sin dejar de asociarlo con que el hecho de que este cuente con el servicio de internet, es por ello que se ejecutaron todas las salidas para este apartado, se suministraron racks, switches, jacks, conmutadores, teléfonos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento.
- k) Los trabajos antes descritos fueron ejecutados para la planta baja del edificio en esta oportunidad, para el primer nivel solo se ejecutaron piso cerámico en todo el nivel, cancelería perimetral y pintura intumescente. Lo anterior por cuestiones estrictamente presupuestales.



II.2.- Documentos anexos

1. Los planos correspondientes a la construcción final (AS BUILT).
2. Manuales e instructivos de operación de equipos, sistemas, acabados, etc.
3. Certificados de garantía de calidad de los bienes instalados.
4. Certificados de pruebas a equipos, instalaciones y sistemas.
5. Juego de llaves (con duplicado) de todo el edificio.

III.- Entrega y Recepción.

En este acto el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México entrega al Instituto Tecnológico Tlalpan las instalaciones correspondientes a la Unidad Multifuncional de Talleres, Laboratorios y Obra Exterior del INSTITUTO TECNOLÓGICO TLALPAN, así como los documentos anexos que se relacionan en el apartado II.2 de esta Acta. Señalando como detalles a cubrirse por la contratista Ingeniería Mexicana Incorporada División Construcción SA de CV, el regulador de 30 KVA; debiéndose subsanar estos detalles a mas tardar en 15 días hábiles a partir de la fecha en que se lleva a cabo este acto de entrega recepción.

Estando de acuerdo las partes que en esta acta intervienen y no habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 11:30 horas del mismo día de su apertura, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para todos los efectos legales a que haya lugar

Por el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México que entregan:

Nombre	Cargo	Firma
Dr. Carlos Alfonso Lara Esparza	Director del ILIFECDMX	

Por el Tecnológico Nacional de México en su calidad de testigo de honor.

Nombre	Cargo	Firma
Lic. Roberto Nevárez Valdez	Director del Área de Infraestructura Física y Mantenimiento del TECNM	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

## SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INOVACIÓN

Instituto Local de la Infraestructura Física  
Educativa, CDMX

Por el Instituto Tecnológico Tlalpan del Tecnológico Nacional de México de la Secretaría de Educación Pública que reciben:

Nombre	Cargo	Firma
Dra. Rocío Castro González	Directora del Instituto Tecnológico Tlalpan	
Lic. Norma Delgado Díaz	Sub directora de planeación del Instituto Tecnológico Tlalpan	

Esta hoja de firmas corresponde al acta de fecha 01 de marzo de 2019, mediante la cual se realiza la entrega- trabajos de la "Unidad Multifuncional de Talleres, Laboratorios y Obra Exterior" del Instituto Tecnológico Tlalpan



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, **15/Mayo/2020**

Oficio No. ITTLALP/DIR/201/2020  
Asunto: Respuesta PIFIT 2016

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ  
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN  
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
PRESENTE

AT'N ROBERTO NEVÁREZ VALDEZ  
JEFE DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA. FÍSICA  
Y MANTENIMIENTO

Reciba un cordial saludo y aprovecho este medio para hacer llegar a usted el REPORTE DE AVANCE DE OBRA correspondiente a la construcción de la "Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios" de éste Instituto, así como la aplicación del recurso del programa de PROEXOESS 2016. De igual forma se anexa el Informe obtenido de la Gerencia de Obra a cargo de su construcción.

Agradezco las atenciones a la presente, y quedo a su disposición para cualquier aclaración.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

Excelencia en Educación Tecnológica®  
"Nuestro éxito, es el éxito de nuestros egresados"

**ROCIO CASTRO GONZÁLEZ**  
**DIRECTORA**

c.c.p. Archivo. Subdirección de Planeación y Vinculación  
RCC/sgp



**REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA**

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLALPÁN

AV. CERRADA DE SANTA CRUZ No. 4, SAN MIGUEL TOPILEZO

C.P. 14500, ALCALDÍA DE TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO	10	12	2017
DÍA	MES	AÑO	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	14	2	2019
DÍA	MES	AÑO	

FECHA DEL REPORTE	11	5	2020
DÍA	MES	AÑO	



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**2020**

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		CONTRATO			ÓRGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN Y/O FINIQUITO	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCIDO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FÍSICO (%)		
PIF 2016	Unidad Multifunciona de Talleres, Laboratorios y Obras Exteriores	\$ 37,099,326.67	\$	36,594,542.92	36,594,542.92	100%	100%	100%		1. El acte finiquito para este contrato está en proceso. 2. A la fecha se adjudican a los contratistas de obras y servicios el importe líquido de \$302,785,000. 3. El edificio de la Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios de Tlalpan no se concluyó en su totalidad, solo se concluyó la primera etapa, en virtud de que el recurso fue insuficiente, quedando pendiente de ejecutar en una segunda etapa los siguientes trabajos: la obra civil y acabados en la planta alta, así como las instalaciones de voz y datos, sistema contra incendio, detección de humos y cuerdas por cableadas, suministro y colocación de elevador para discapacitados. Todo esto en la planta alta de manera general, por un monto aproximado de 12 millones de pesos.

RECURSOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTOS A LA TESOROFE (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPÓSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: SALOMÓN GARCÍA PAREDES  
CARGO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN  
CORREO: sgarcia@itec.mx  
TEL: 565513815

AUTORIZO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE: ROCÍO CASTRO CONTRALEZ

FIRMA

SELLO OFICIAL

JUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

EXCESS (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN - MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)  
41 (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014-2019)  
LÍNEAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

